

# Utbyggnad VA Hyndevad v.16-17 - 2024

## Sandbankarna:

- Diverse återställningsarbeten.
- Provtagning vattenkvalitet.

## Hyndevadstrand:

- Hyndevad strandväg, montage av vägräcken, asfaltering och montage av kantsten.
- Schakt- och VA-arbeten vid damm D (vid pumpstation P12)
- Diverse återställningsarbeten.
- Provtagning vattenkvalitet.

## Närsjö:

- **Elarbeten utförs av EEM Elnät**

## Dalhagen:

- Diverse återställningsarbeten.
- Provtagning vattenkvalitet.
- **Elarbeten utförs av EEM Elnät**

## Sandhem:

- Bukettvägen, Justering för och asfaltering.
- Borsöknavägen och Närsjövägen, Asfaltering.
- Hattranvägen, Montage återstående vägräcken samt slänt mot Sandhemsv. 26.
- Borsöknavägen, Fräsning och schakt återstående asfalt.
- Provtagning vattenkvalitet.

## Borsöknasjön:

- Diverse återställningsarbeten.
- Justering för och asfaltering.



**Kommande arbeten V.16-V.17**

- Infart från väg 230 ner till Hyndevadstrand parallellt med vattenverket **avstängd**, alternativa vägar markerat i **blått**.
- Bukettvägen - Asfaltjustering samt asfaltering
- Diverse återställningsarbete i hela området (påverkar inte trafiken)


Vi spolar även vatten på flera ställen i Hyndevadstrand, för att ta vattenprover som möjliggör att vi kan få ett godkänt system.

## Kommande arbeten V.16-V.17

- Diverse återställningsarbeten runt om i hela området (påverkar inte trafiken).

Vi spolar även vatten på flera ställen i Dalhagen, för att ta vattenprover som möjliggör att vi kan få ett godkänt system.




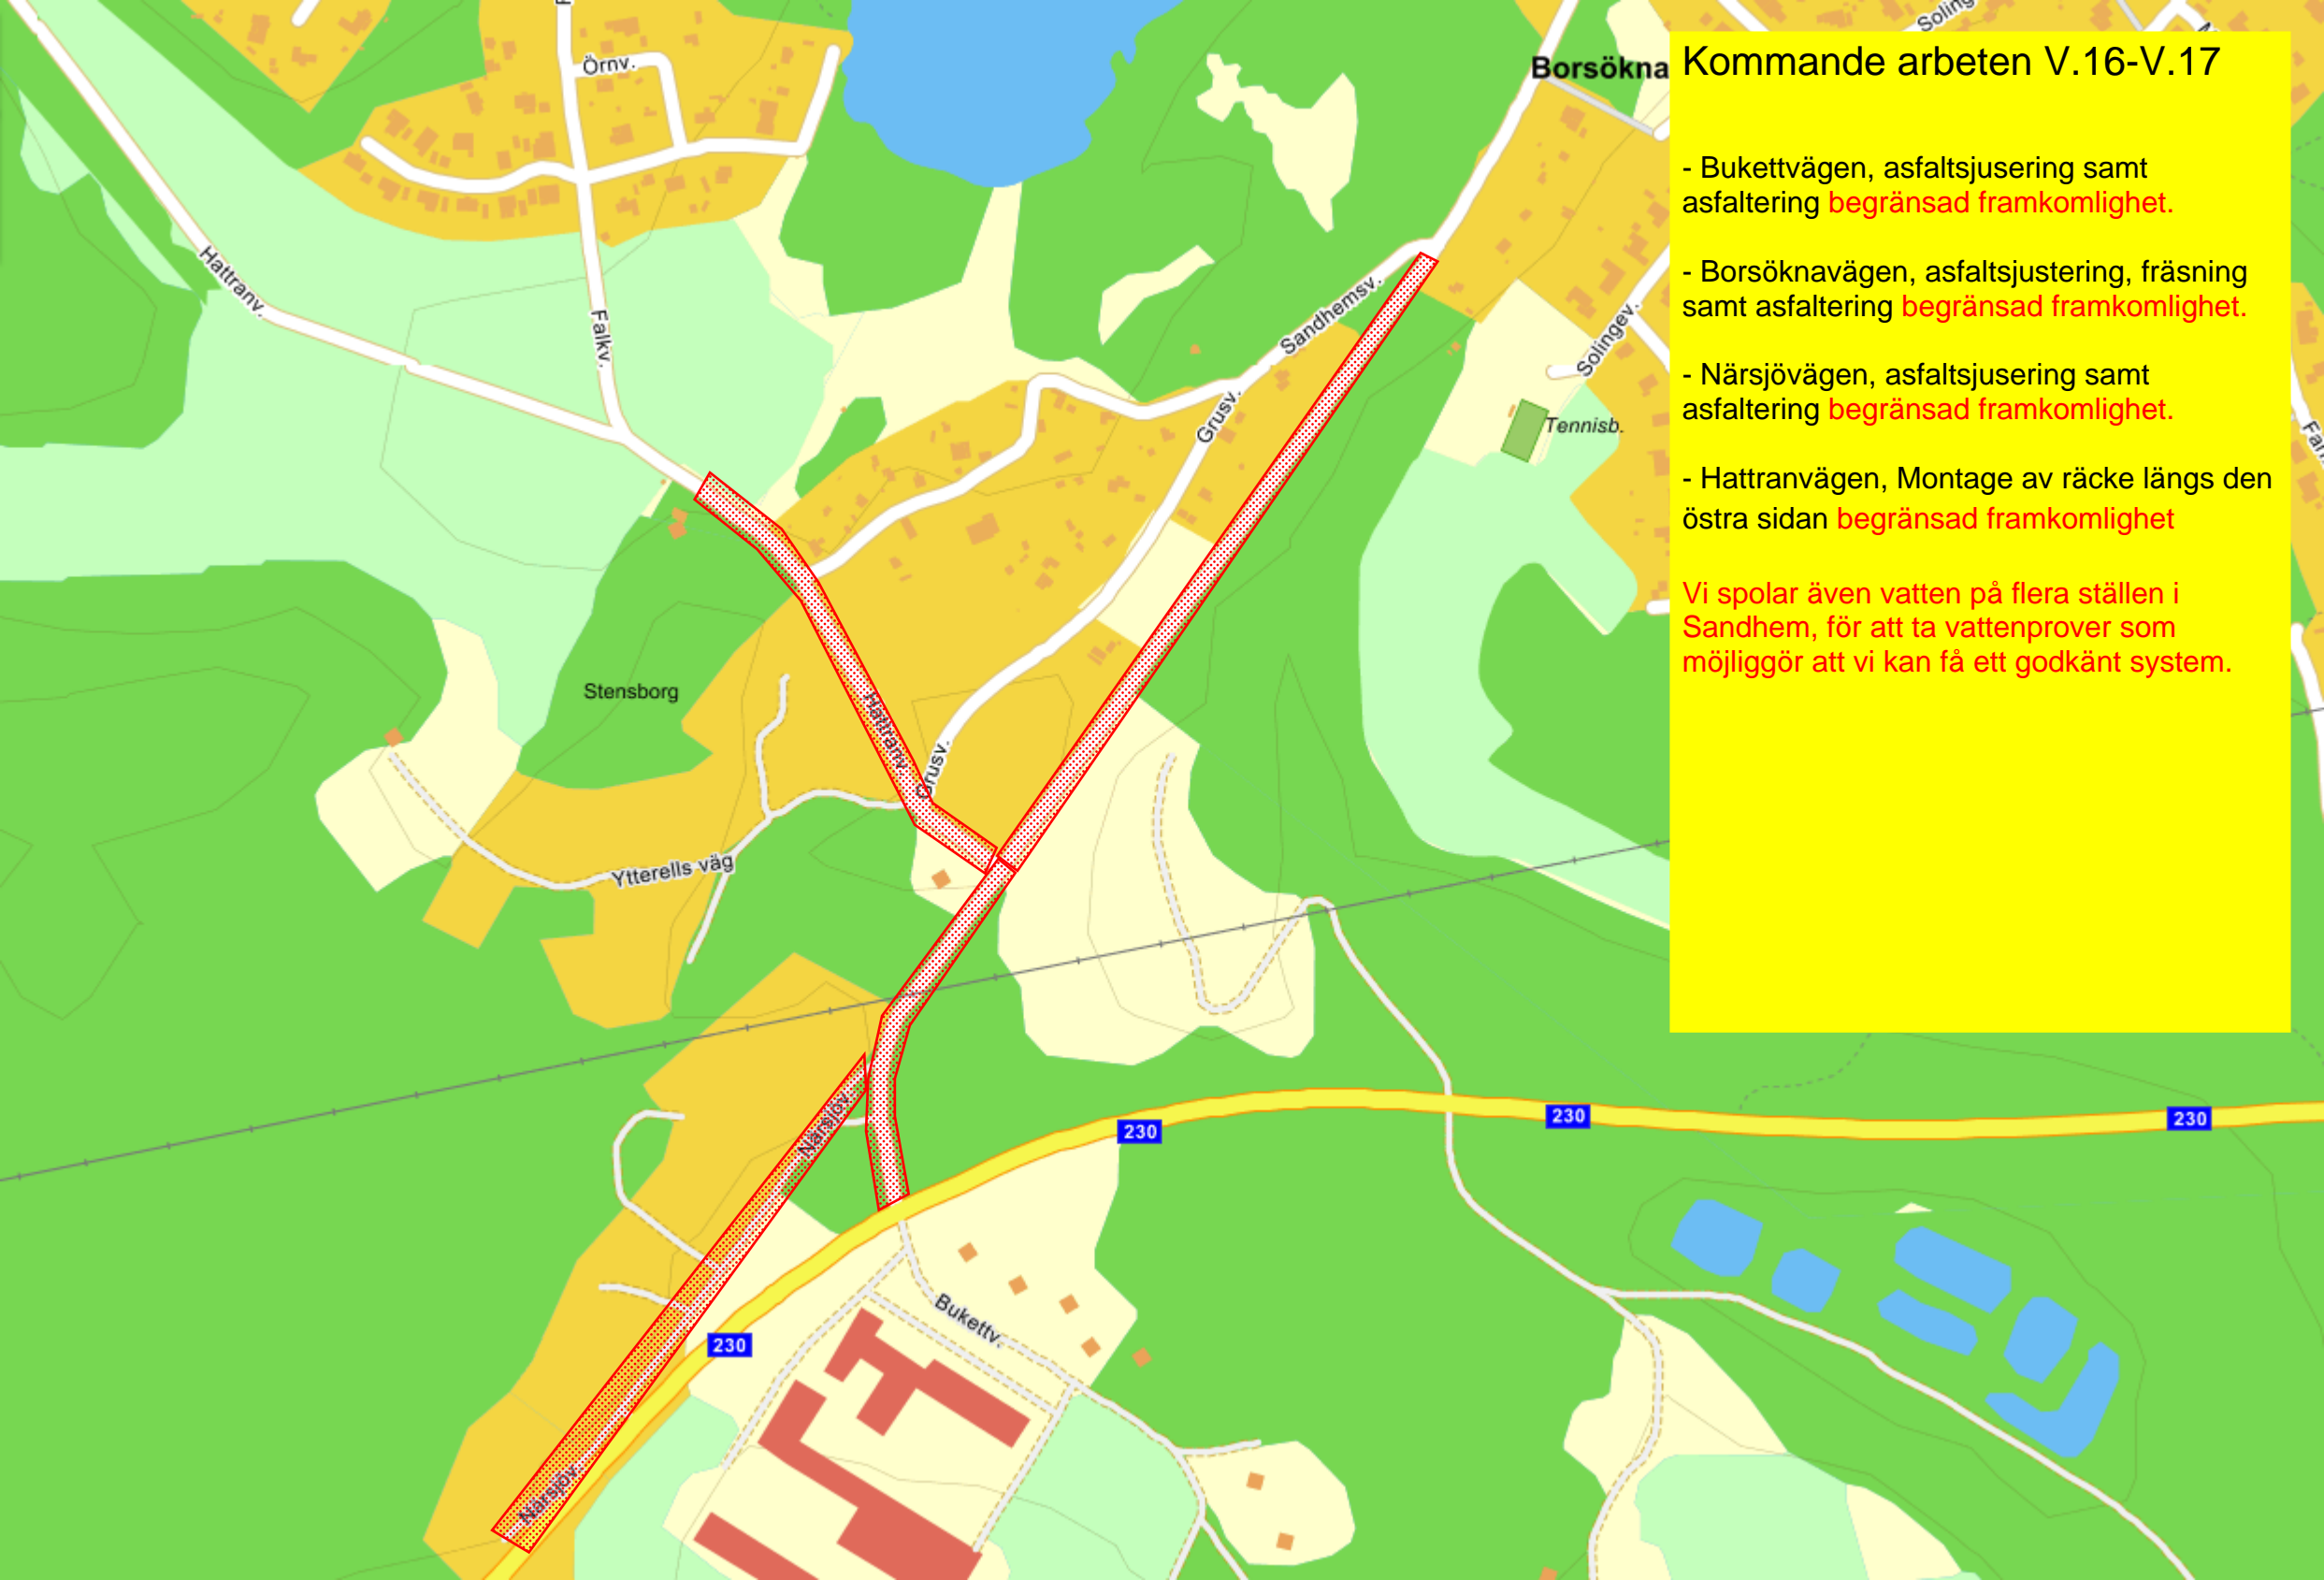

## Borsökna Kommande arbeten V.16-V.17

- Bukettvägen, asfaltsjustering samt asfaltering **begränsad framkomlighet.**
- Borsöknavägen, asfaltsjustering, fräsning samt asfaltering **begränsad framkomlighet.**
- Närsjövägen, asfaltsjustering samt asfaltering **begränsad framkomlighet.**
- Hattranvägen, Montage av räcke längs den östra sidan **begränsad framkomlighet**

Vi spolar även vatten på flera ställen i Sandhem, för att ta vattenprover som möjliggör att vi kan få ett godkänt system.

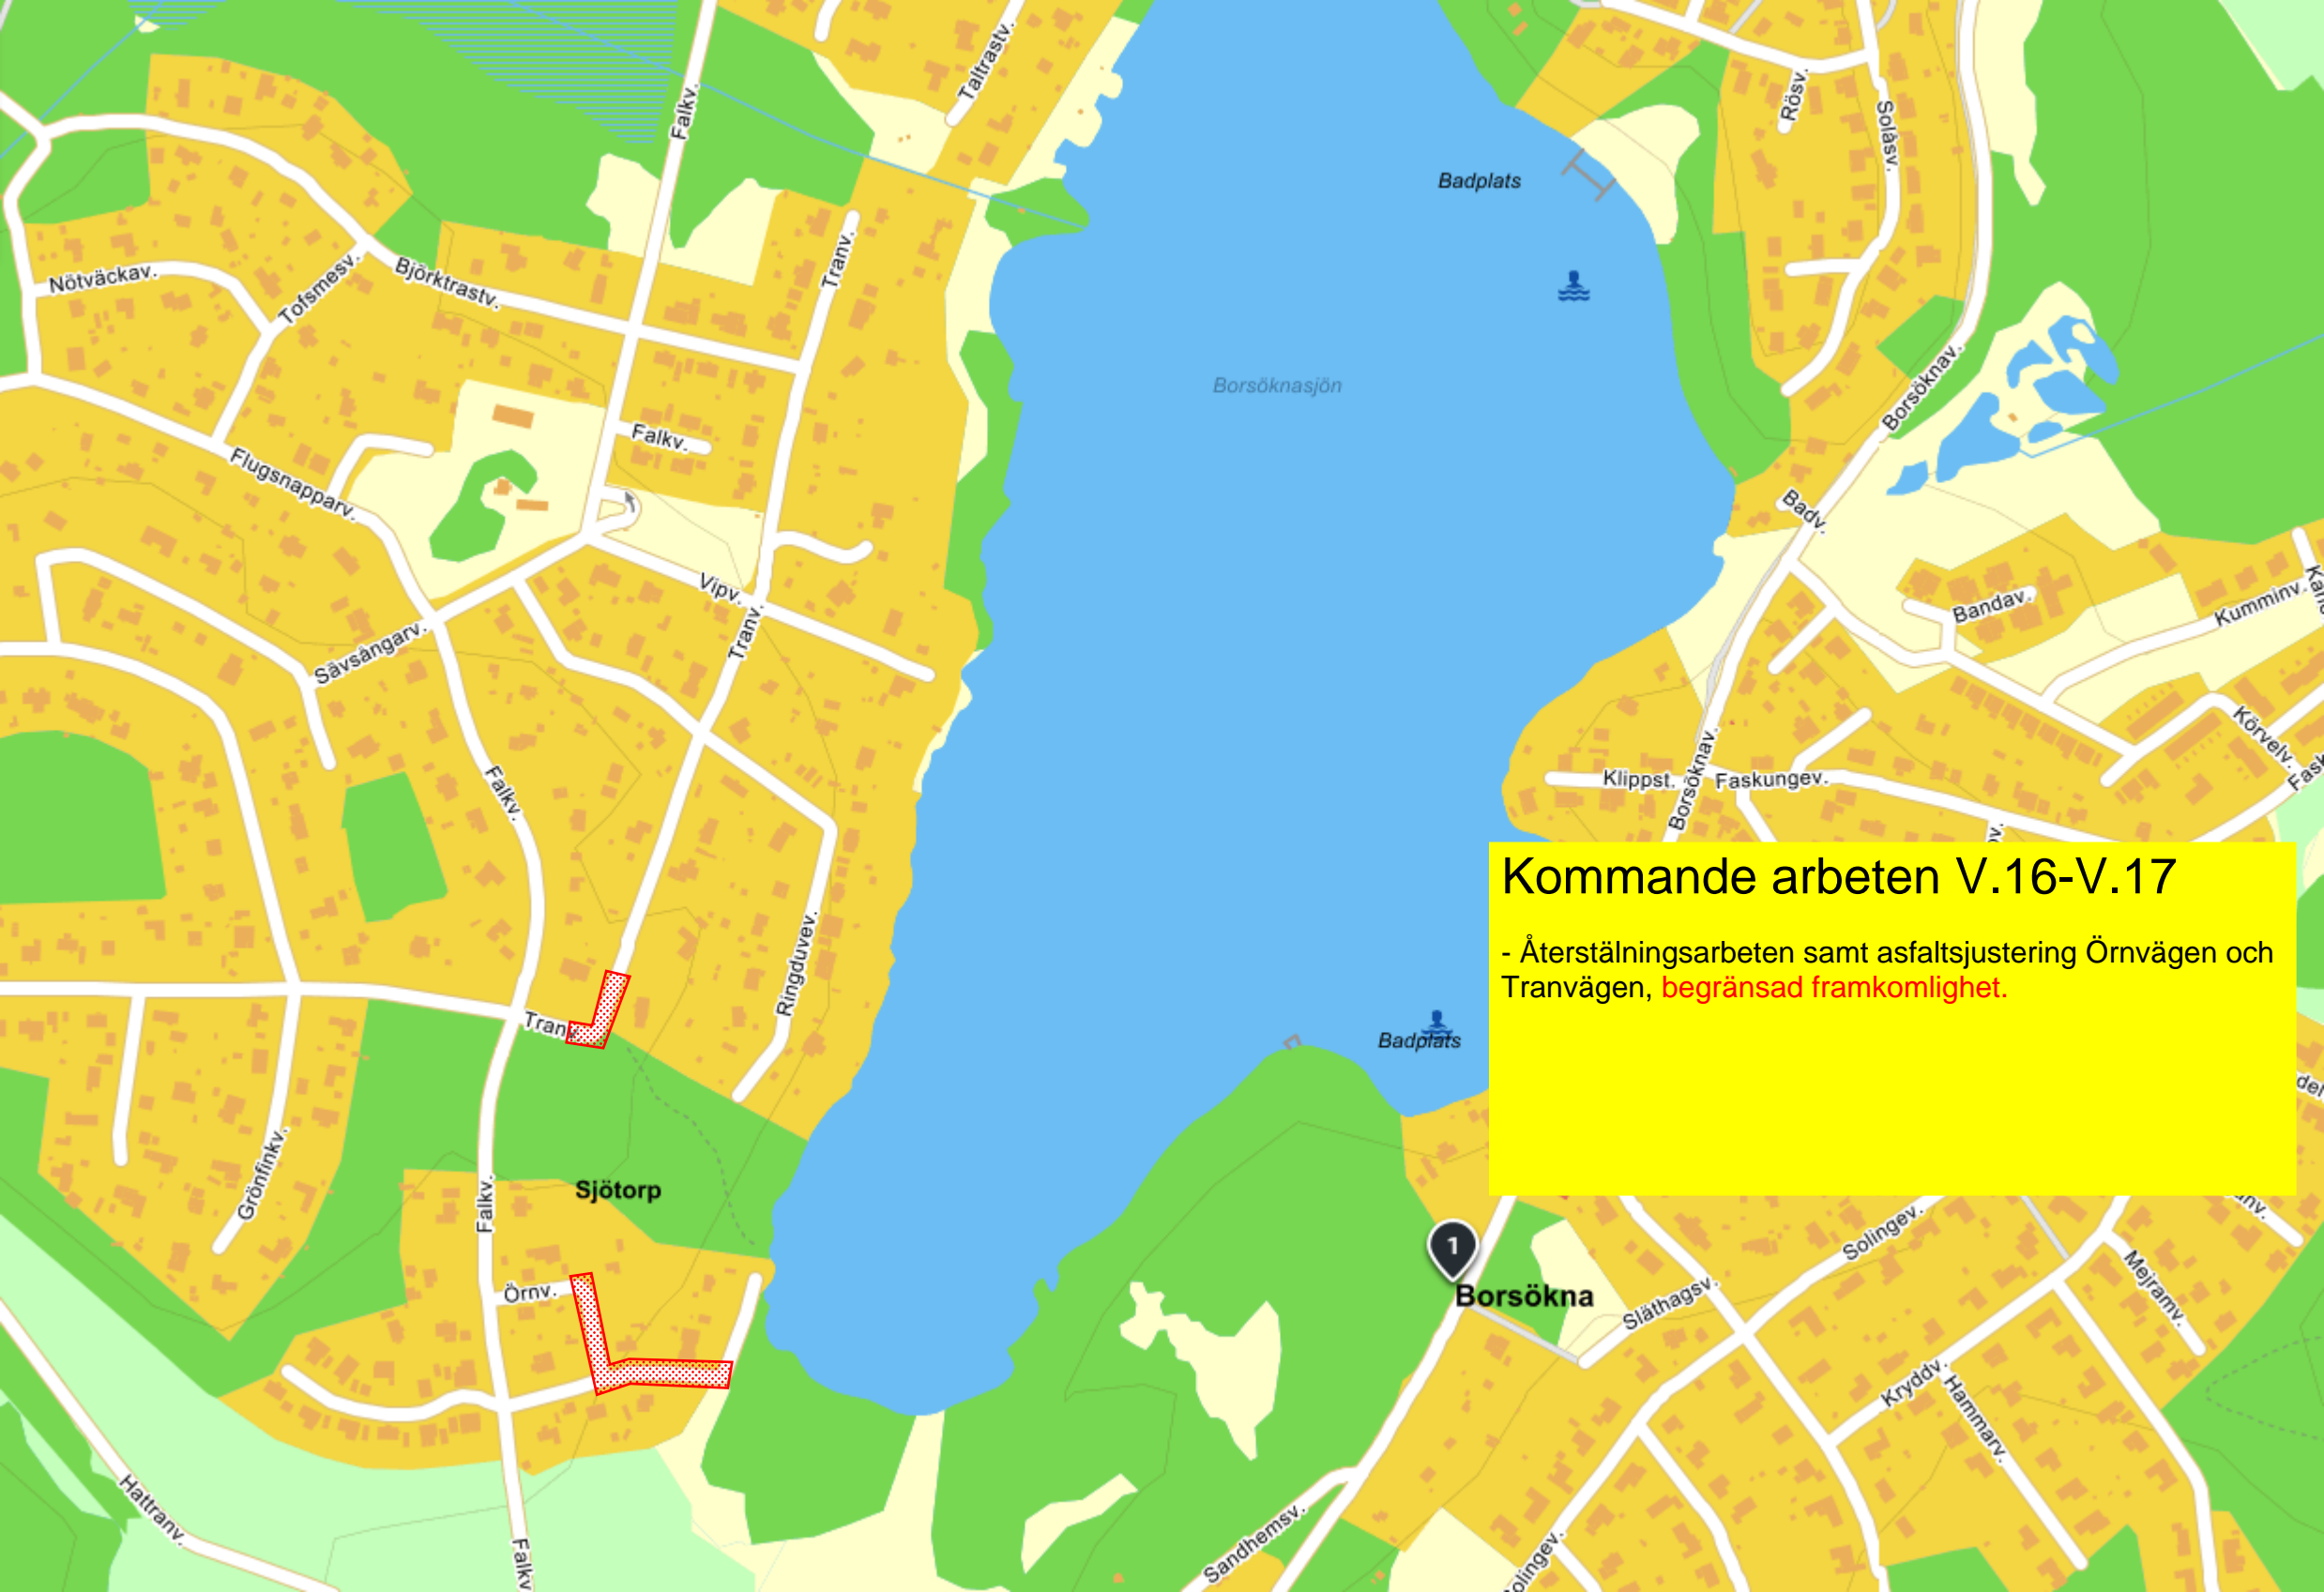

## Kommande arbeten V.16-V.17

- Återställningsarbeten samt asfaltsjustering Örnvägen och Tranvägen, **begränsad framkomlighet.**
